

企 画 提 案 書

那珂川の水辺空間を活かした 回遊促進・賑わい創出事業 企画運営業務委託

— 提案競技 企画提案書 —

STATEMENT

この春、那珂川の護岸と橋梁に新しい灯りがとまります。本イベントは、そのお披露目の場です。

私たちは、福岡市が「リバーフロントNEXT」として進める、川に向かって開かれたまちづくりの方針を理解し、共有しています。この9日間を一度きりの催して終わらせず、街として川沿いの価値を高め続けていくための、最初の一步として企画しました。

令和8年11月 日 提出

【正本のみ記載】 提案者名／担当者氏名／連絡先

IMAGE

キービジュアル（デザイナー制作）

NAKAGAWA RIVER NIGHTS

川が、夜のステージになる。（仮）

CONTENTS

1	実施内容 コンセプト・KV／会場とプログラム／ヘッドライナー／回遊とアート ／今後の展開	配点 60	1-5
2	広報・プロモーション SNSを軸にした国内外来街者への情報拡散	配点 10	6
3	運営体制 実施体制・安全管理・関係者調整	配点 10	7
4	運営スケジュール 契約から報告書提出までの全体工程	配点 5	8
5	追加提案 事業者独自の取組み	配点 5	9
別紙	見積書		10

那珂川を「渡る川」から、夜に「巡る川」へ。

テーマ

仮・別途確定

NAKAGAWA RIVER NIGHTS

川が、夜のステージになる。

CONCEPT

仮

天神と中洲のあいだを流れる那珂川は、夜になると、ただ渡るだけの川になる。新しくなった清流公園と、灯りをまとった護岸。そのあいだを、音楽とパフォーマンス、水上のステージ、アートと食でつなぎ、川沿いをひとつの夜の回廊にする。歩くほどに、次の楽しみが見えてくる。那珂川を、この街の夜の目的地へ。

ターゲット

メイン 国内外の観光客

アジアからの訪日客・国内旅行者（20～40代）

サブ 都市圏の来街者

天神・中洲で夜を過ごす20～40代


KEY VISUAL

イベントキービジュアル（デザイナー制作）

課題といまの理由 川は「橋を渡るだけ」の通過空間。清流公園の供用とライトアップ完成（R9.2予定）で、水辺の「お披露目」の時期を迎える

目標（仮）：延べ来場 100,000人 / 回遊参加 10,000人 / 平均滞在 +60分 / SNS投稿 10,000件

岸辺・橋の上・川面の上に、6つの「夜の目的地」を置く

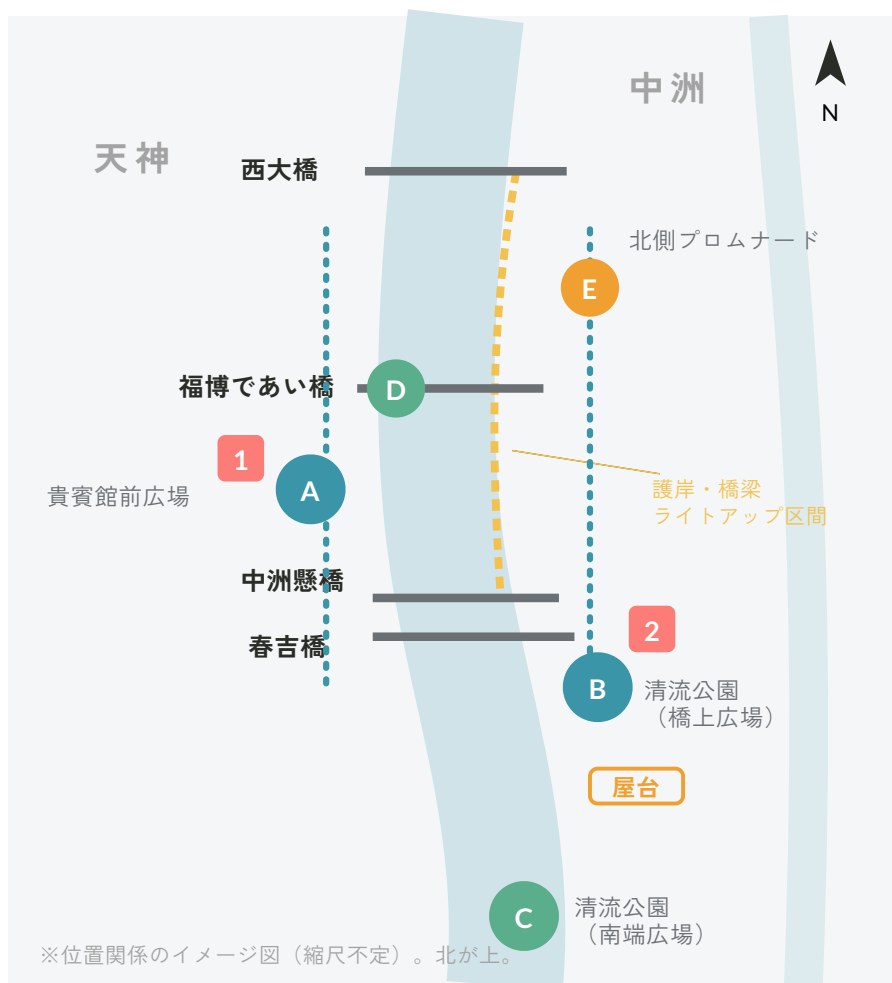

A 貴賓館前ステージ 天神中央公園

明治の洋館とライトアップを背にした、北のメインステージ。DJ・ジャズ・サーカスの日替わりプログラム

IMAGE
貴賓館前ステージ

B 春吉橋ミニステージ 清流公園 橋上広場

DJ・アコースティック。橋の上から川とライトアップを見渡せる、南のステージ

IMAGE
春吉橋ミニステージ

C 水上ステージ 南端広場前・三連休

南端広場の前に台船を係留した、川に浮かぶステージ。三連休に開き、最終日はメインアクトの舞台に

IMAGE
水上ステージ

D 屋形船ジャズ 福博であい橋周辺

屋形船の上でジャズを生演奏。乗船は有料・予約制で、岸辺にも音が流れる

IMAGE
屋形船ジャズ

1・2 常設アート 貴賓館前／橋上広場

DOBくん（貴賓館前）とNONOTAK（橋上広場）を、川沿いを巡る北と南の起点に置く

IMAGE
常設アート

E マルシェ 北側プロムナード

北側プロムナードに食・酒・クラフトの夜市。GohGanの特別ブースと屋台連携

IMAGE
マルシェ

北（A・①）と南（B・②・C）の両端に核を置き、その間の川沿いを歩かせる。照明はライトアップ箇所と河川面に当てない

HEADLINERS 出演候補（未交渉）

椎名林檎

I M A G E

シルク・ドウ・ソレイユ

IMAGE

椎名林檎 アーティスト写真

IMAGE

Aステージ イメージパース

IMAGE

Bステージ イメージパース

IMAGE

Cステージ（台船） イメージパース

IMAGE

屋形船ジャズ イメージパース

D 屋形船ジャズ 毎夜3便

- 国内外のジャズミュージシャン
- TOKU／小沼ようすけ
- Goh Gan 監修の料理

[illegible]

時間差のステージと、世界的なアートで、川沿いを歩かせる

リレー型タイムテーブル（例）

	18:00	18:45	19:30	20:15	21:00
A 貴賓館前	DJ		LIVE		LIVE
B 春吉橋		LIVE		DJ	
C 水上（三連休）			SHOW		MAIN
D 屋形船	便1		便2		便3

南北の演目を約45分ずらし、「次はあっち」で川沿いの往復を生む

デジタルスタンプラリー

QRで参加。5言語対応・インストール不要

- ー 010 BUILDING もスポットに追加
- ー 3か所で周辺店舗のクーポン
- ー 全制覇で限定ノベルティ・屋形船の抽選

IMAGE
スタンプラリ
ー画面イメー
ジ

常設アート＝フォトスポット（2か所・イベント後も常設）

01 | 貴賓館前広場（天神側の入口）

DOBくん

IMAGE 村上隆（むらかみ・たかし）
作家

1962年東京都生まれ。現代美術家。日本の美術とサブカルチャーをつなぐ「スーパーフラット」を提唱し、世界各地の美術館で展覧会を開く。DOBくんは1993年に生まれた、村上作品を代表するキャラクター

IMAGE
DOBくん 作品画像

天神から川へ向かう入口に置く北の起点

02 | 清流公園 橋上広場

NONOTAK

IMAGE NONOTAK Studio（ノノタック）
作家

パリを拠点に活動するアートユニット。イラストレーターのノエミ・シュパーと、建築家でミュージシャンのタカミ・ナカモトによる。光と音で没入型の空間をつくるインスタレーションを世界各地で発表

IMAGE
NONOTAK 作品画像

春吉橋側の南の起点。光は内向きに設計し、ライトアップと河川面に干渉させない

※設置・維持管理は公園管理者と協議。作家プロフィールは最終確認のうえ記載

1週間で終わらせない。「残るもの」と「続く仕組み」をイベントで仕込む

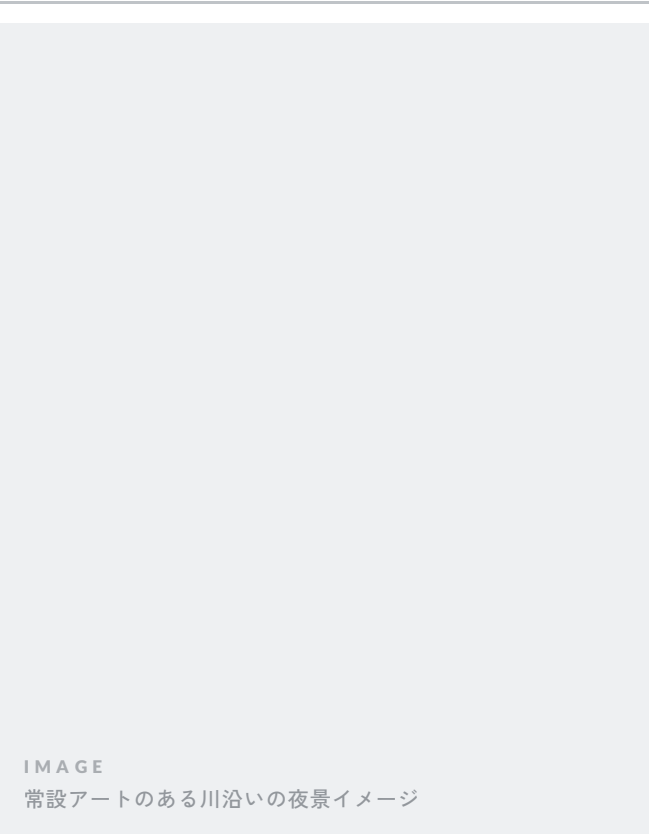


IMAGE
常設アートのある川沿いの夜景イメージ

残る 常設アート2基

会期後も定番フォトスポットとして来訪の理由に

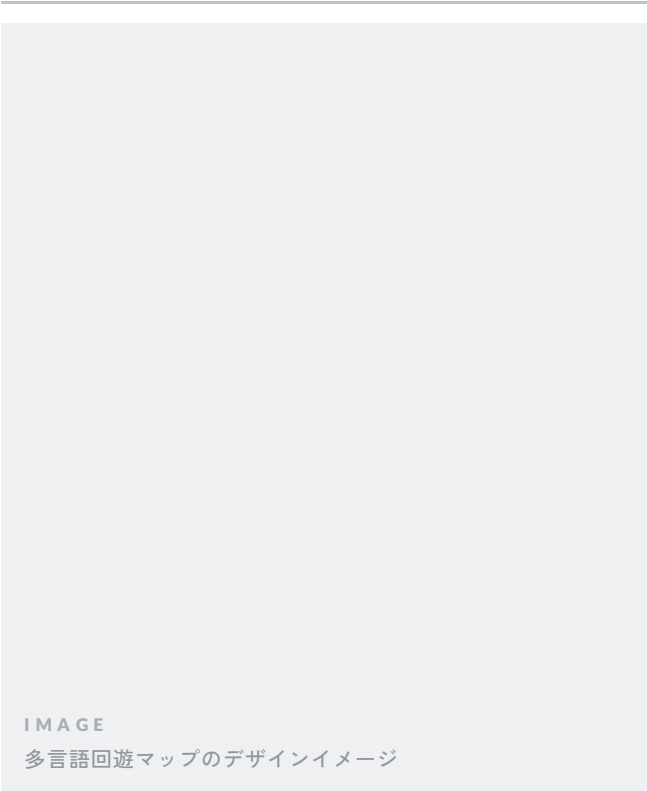


IMAGE
多言語回遊マップのデザインイメージ

歩ける 夜の回遊マップ

ホテル・観光案内所・空港で配布し、いつでも使えるガイドに

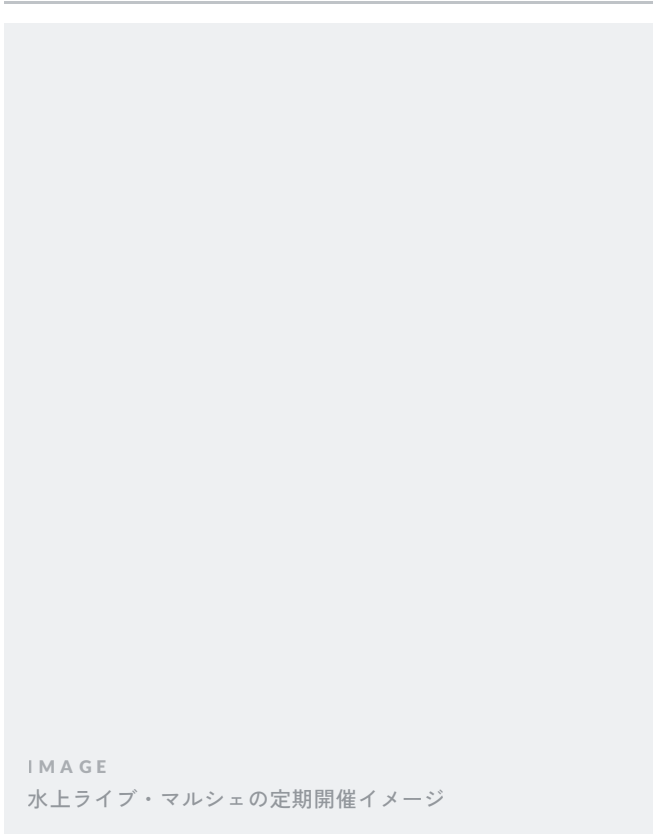


IMAGE
水上ライブ・マルシェの定期開催イメージ

続く 定期プログラム化

反響の大きい企画を民間主体で定期開催

夜のモデルコース（例）

90分 天神 → DOBくん → であい橋 → 屋台

2時間 屋形船 → プロムナード → NONOTAK

はしご マルシェ → 春吉 → 中洲 → 屋台

展開ロードマップ（案）

2027.3	2027年度	2028～
本イベント アート設置	定期開催を 試行	須崎公園まで 延伸・民間運営へ

「発表」を4回つくり、会期までニュースを途切れさせない

12月 12/下 公式SNS開設 ライトアップ工事・アート制作の ティザー発信	1月 1/中 公式サイト公開（5言語） 発表① 開催決定・第1弾出演者	2月 発表② メインアクト・整理券応募開始 2/下 発表③ 点灯式×アート除幕（記者発表会）	3月上旬 市政だより掲載、シティドレッシング開始（博多駅・天神・地下鉄） 海外向け広告を強化、インフルエンサー来福	会期中・後 毎日の見どころ・混雑情報、ライブ配信 発表④ 実績リリース・アフタームービー
--	--	---	--	---

施策	内容	KPI（仮）	費用（円）
シティドレッシング	フラッグ・バナー・柱巻き・サイネージの制作と設置（右記）	主要動線を会期前から装飾	400,000
公式サイト	5言語。タイムテーブル・整理券応募・回遊マップ	20万PV	700,000
SNS運用	Instagram・TikTok・X。フォトコンテスト	投稿1万件	600,000
SNS広告	福岡都市圏と、韓国・台湾・香港の訪日予定者	リーチ500万	600,000
インフルエンサー	国内・海外（韓・台・香）を招待	投稿60本	500,000
メディアPR	リリース4回、点灯式×アート除幕の記者発表会	掲載50件	250,000
印刷物	多言語ポスター・フライヤー（ホテル・観光案内所）	配布3万部	150,000
合計（見積書「広報・プロモーション費」）			3,200,000

シティドレッシング 最小限の予算で、最大限の面を取る

- 01

無償で押さえる

キャナルシティ博多・清流公園

会場とその周辺をフラッグ・バナー・装飾で彩り、来街者が会場に近づくほど期待が高まる導線をつくる
- 02

協力で押さえる

博多駅・天神

行政の広告枠と、西鉄エージェンシーとの協力で、駅・バス・天神エリアのサイネージやポスター面を確保する
- 03

タイアップで押さえる

福岡市地下鉄

地下鉄とのタイアップコンテンツで、駅構内・車内の面を獲得する。スタンプラリーとも連動させる



街なかの面で会期を知らせ、SNSで広げる。来場者の投稿が次の来場者を呼ぶ循環をつくる

運営責任者のもとで全会場に人を配置し、安全を最優先に動かす

実施体制

福岡市

⇔


代表事業者（統括）
運営責任者：○○○○

企画・制作 [構成員名]	ステージ制作 [構成員名]
キャスティング [構成員名]	水上運営 [舟運事業者]
アート [構成員名]	回遊・デジタル [構成員名]
広報・PR [構成員名]	警備・安全 [警備会社]

連携 | 清流公園 指定管理者 (FJグループ)
三連休 (3/20~22) の会場枠を本イベントに提供

自社 | THEATER 010・GohGan (010 BUILDING)
演目・料理監修で全面協力

人員配置図（会期中・イメージ）

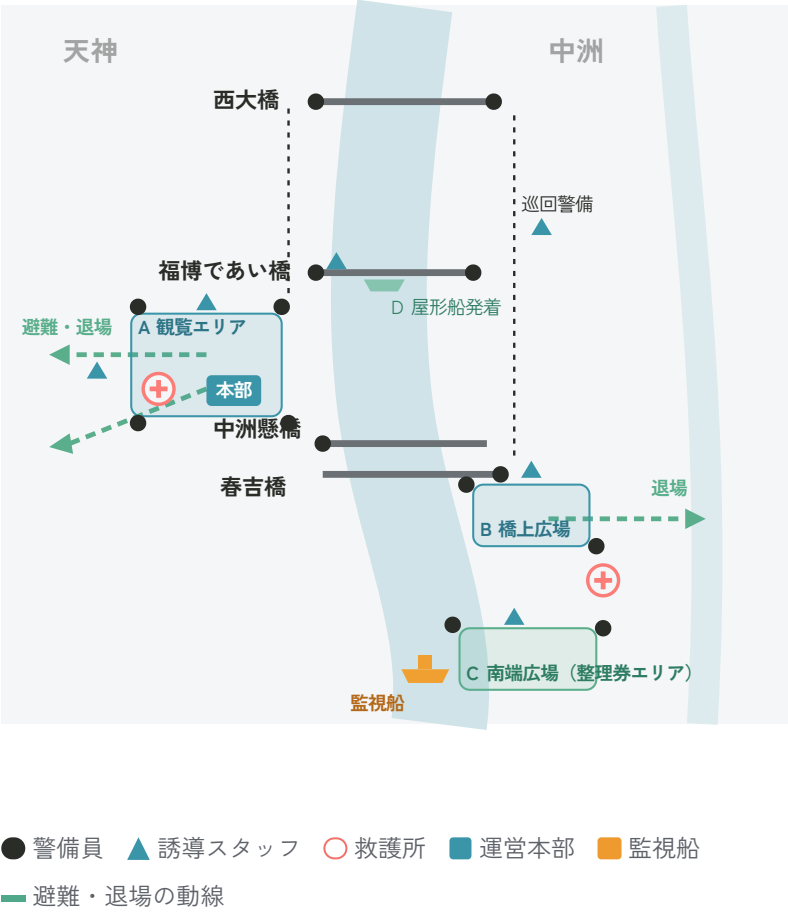

配置人数（1日あたり・仮）

配置場所	平日	土日	メイン アクト日
運営本部・救護	6	6	8
A 貴賓館前	14	16	16
B 橋上広場	8	10	10
C 南端広場・水上	-	10	40
D 屋形船発着	4	4	4
マルシェ・橋の巡回	10	12	16
合計	42	58	94

安全対策・緊急時対応

- －メインアクトは整理券制、観覧エリアを区切る
- －水上：救命胴衣・監視船
- －本部に救護所、医療機関と連携
- －災害・テロ時の避難誘導、雨・強風時の中止基準

- －責任者は完了まで交代なし
- －市と週1回の定例会

関係者調整・許認可 地域・屋台組合、警察・消防、保健所、公園・河川管理者と契約直後から協議し、**占用許可・道路使用・食品営業**を進める。
詳細な警備計画は実施計画書で示す

許認可と出演者の確定を12月中に前倒しし、無理のない工程で3月を迎える

	11月		12月		1月		2月		3月	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
契約・実施計画書			実施計画書の作成							
関係者協議・許認可			公園・河川・警察・保健所との協議と申請							
出演者交渉・確定			出演交渉→確定							
アート制作・設置			設計・制作						設置	
会場設計・設営			会場設計・資機材手配						設営	
回遊ツール開発			スタンプラリー開発・テスト							
広報・プロモーション					サイト公開 → 出演者発表 → 会期中の発信					
イベント開催									開催	
撤去・効果検証・報告										報告

11/25～ 契約締結
すぐに関係者協議を開始

12月下旬 実施計画書の提出
出演者・会場計画を確定

3/14～3/22（案） 開催
三連休を含む9日間、夕方～夜

3/31 実施報告書の提出
効果検証・今後の展開

弊社だから用意できる会場と、コンテンツがある

01

指定管理者の三連休枠で、南端広場に台船ステージを

3/20～22の三連休は、本来は清流公園の指定管理者（FJグループ）の利用枠です。弊社はFJグループと連携しているため、**この枠を本イベントに提供してもらえます**。三連休の3日間、南端広場の前に台船の水上ステージを開き、最終日は椎名林檎のメインアクトで締めくくります

IMAGE

南端広場 台船ステージイメージ

02

自社の THEATER 010・GohGanを全面投入

THEATER 010は、ニューヨーク・ロンドンの「THE BOX」の制作チームが演出するイマーシブシアター。**GohGan**は、福山剛シェフとガガン・アナンド氏によるレストランです。どちらも弊社のコンテンツなので、**水上ステージの特別演目や屋形船・マルシェの料理監修を、本イベントに合わせて組めます**。会場の中洲から歩ける010 BUILDINGも、回遊の行き先にします

IMAGE

THEATER 010・GohGan写真

03

「ナイトパス」で周辺店舗と連携

スタンプラリーの特典を周辺の飲食店や屋台で使えるようにし、**イベントの外まで消費を広げます**

IMAGE

クーポン画面・参加店舗ステッカー

04

データで効果を検証する

人流データ・回遊ログ・アンケートで**滞在時間と消費の変化**を示し、次年度以降の判断材料にします

IMAGE

人流ヒートマップの分析イメージ

見積書（概算）

項目	内訳	金額（円・税抜）
企画・制作管理費	全体企画、実施計画書の作成、制作進行管理、関係者調整、許認可申請	2,800,000
会場設営・装飾費	ステージ2か所（A・B）、音響・照明・映像、電源・通信、テント・備品、装飾デザイン	8,100,000
出演・コンテンツ制作費	メインアクト、サーカス・ジャズ・DJ等の出演料、演出制作	9,000,000
水上ステージ費	台船の手配・曳航・係留、ステージ設営、水上の安全管理（三連休）	4,200,000
屋形船ジャズ費	屋形船チャーター、ジャズ出演料、予約システム	1,600,000
アート制作・設置費	常設アート2基の制作・輸送・設置・基礎工事、キュレーション	5,500,000
回遊施策費	デジタルスタンプラリーの開発・運用（5言語）、回遊マップ、特典・ノベルティ	1,400,000
マルシェ運営費	出店者の募集・調整、什器、リユース食器、衛生管理	1,000,000
広報・プロモーション費	シティドレッシング、公式サイト（5言語）、SNS運用・広告、インフルエンサー招待、PR、印刷物	3,200,000
警備・安全対策費	警備員の配置、救護所、整理券の運用、保険	3,300,000
運営スタッフ・清掃費	運営スタッフ、通訳、清掃・廃棄物処理	1,800,000
効果検証・報告書作成費	人流データ分析、アンケート、実施報告書の作成	600,000
小計		42,500,000
消費税及び地方消費税（10%）		4,250,000
合計（提案限度額 46,750,000円 以内）		46,750,000

※協賛金を得た場合は、上記に上乗せして事業内容の充実にあてる。出演料・アート費は交渉により変わる可能性あり
