

企画提案書

那珂川の水辺空間を活かした 回遊促進・賑わい創出事業 企画運営業務委託

— 提案競技 企画提案書 —

IMAGE

キービジュアル（デザイナー制作）

令和8年11月 日 提出

【正本のみ記載】 提案者名／担当者氏名／連絡先

NAKAGAWA RIVER NIGHTS

川が、夜のステージになる。（仮）

CONTENTS

1	実施内容 コンセプト・KV／会場とプログラム／ヘッドライナー／回遊とアート ／今後の展開	配点 60	1-5
2	広報・プロモーション SNSを軸にした国内外来街者への情報拡散	配点 10	6
3	運営体制 実施体制・安全管理・関係者調整	配点 10	7
4	運営スケジュール 契約から報告書提出までの全体工程	配点 5	8
5	追加提案 事業者独自の取組み	配点 5	9
別紙	見積書		10

那珂川を「渡る川」から、夜に「巡る川」へ。

テーマ

仮・別途確定

NAKAGAWA RIVER NIGHTS

川が、夜のステージになる。

音・水・光・食で川沿いを一本の「夜の回廊」にする

LIVE

音で巡る

WATER

川面で遊ぶ

ART

撮って残す

TASTE

味わう

ターゲット

メイン 国内外の観光客

アジアからの訪日客・国内旅行者（20～40代）

サブ 都市圏の来街者

天神・中洲で夜を過ごす20～40代


KEY VISUAL

イベントキービジュアル（デザイナー制作）

課題といまの理由 川は「橋を渡るだけ」の通過空間。清流公園の供用とライトアップ完成（R9.2予定）で、水辺の「お披露目」の時期を迎える

目標（仮）：延べ来場 100,000人 / 回遊参加 10,000人 / 平均滞在 +60分 / SNS投稿 10,000件

岸辺・橋の上・川面の上に、6つの「夜の目的地」を置く

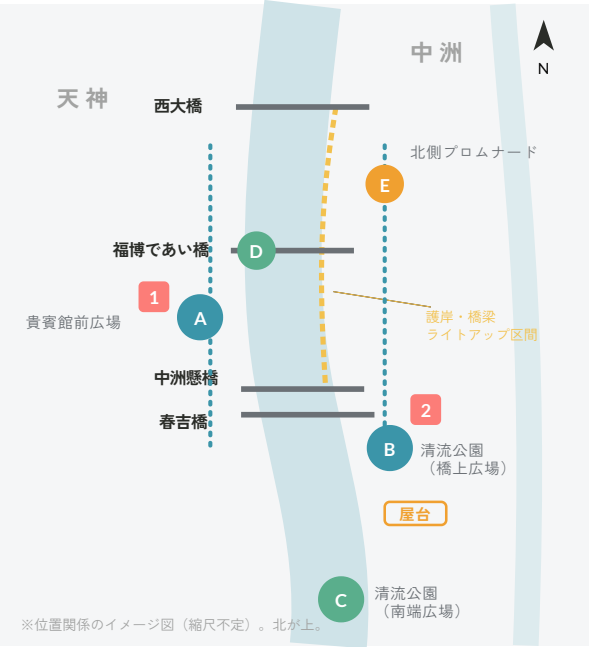

A 貴賓館前ステージ 天神中央公園
洋館とライトアップを背にした北のメインステージ

C 水上ステージ 南端広場前・土日
台船を係留した、川に浮かぶステージ

1・2 常設アート 貴賓館前／橋上広場
DOB くとNONOTAKを北と南の起点に

B 春吉橋ミニステージ 清流公園 橋上広場
DJ・アコースティック。橋の上が夜景の見どころに

D 屋形船ジャズ 福博であい橋周辺
船上の生演奏。有料・予約制

E マルシェ 北側プロムナード
福岡の食・酒・クラフト。屋台と連携

9日間のプログラム（案）

	3/13（土）	3/14（日）	3/15（月）	3/16（火）	3/17（水）	3/18（木）	3/19（金）	3/20（土）	3/21（日）
A 貴賓館前	OPENING DJ	アイドル DAY	DJ NIGHT	DJ NIGHT	サーカス DAY	DJ NIGHT	サーカス DAY	アイドル DAY	FINAL メインアク ト
B 春吉橋	DJ	Rin音	DJ	弾き語り	DJ	弾き語り	DJ	藤原さくら	DJ
C 水上	博多芸妓	DRUM TAO						DRUM TAO	ダンス
D 屋形船	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ	JAZZ

北（A・①）と南（B・②・C）の両端に核を置き、その間の川沿いを歩かせる。照明はライトアップ箇所と河川面に当てない

福岡ゆかりのアーティストと、世界のパフォーマンスを那珂川へ

HEADLINERS 出演候補（未交渉）



椎名林檎

A 貴賓館前 | 3/21 FINAL

福岡で育ったシンガーソングライター。最終日のメインアクト（整理券制）

シルク・ドゥ・ソレイユ

A 貴賓館前 | サーカスDAY

カナダ・モントリオール発のサーカス・エンターテインメント

HKT48

A 貴賓館前 | アイドルDAY

博多を拠点に活動するアイドルグループ

藤原さくら

B 春吉橋 | 3/20

福岡市出身のシンガーソングライター

DRUM TAO

C 水上 | 土日

大分を拠点に世界で公演する和太鼓エンターテインメント



A 貴賓館前ステージ 17:30-21:30

- － 椎名林檎（最終日）
- － シルク・ドゥ・ソレイユ
- － HKT48／LinQ／ばってん少女隊
- － DJ 沖野修也／Licaxxx

B 春吉橋ミニステージ 17:30-22:00

- － 藤原さくら／Rin音（福岡市出身）
- － 福岡のクラブシーンのDJ

C 水上ステージ 土日 19:00-21:00

- － DRUM TAO
- － 博多芸妓（博多の伝統芸能）

D 屋形船ジャズ 毎夜3便

- － 中洲ジャズと連携したキャスティング
- － TOKU／小沼ようすけ

時間差のステージと、世界的なアートで、川沿いを歩かせる

リレー型タイムテーブル（例）

	18:00	18:45	19:30	20:15	21:00
A 貴賓館前	DJ		LIVE		MAIN
B 春吉橋		LIVE		DJ	
C 水上（土日）			SHOW		
D 屋形船	便1		便2		便3

南北の演目を約45分ずらし、「次はあっち」で川沿いの往復を生む

デジタルスタンプラリー

QRで参加。5言語対応・インストール不要

- ー 3か所で周辺店舗のクーポン
- ー 全制覇で限定ノベルティ・屋形船の抽選

IMAGE
スタンプラリー
画面イメージ

常設アート＝フォトスポット（2か所・イベント後も常設）

01 | 貴賓館前広場（天神側の入口）

DOBくん

IMAGE 村上隆（むらかみ・たかし）
作家

1962年東京都生まれ。現代美術家。日本の美術とサブカルチャーをつなぐ「スーパーフラット」を提唱し、世界各地の美術館で展覧会を開く。DOBくんは1993年に生まれた、村上作品を代表するキャラクター

IMAGE
DOBくん 作品画像

天神から川へ向かう入口に置く北の起点

02 | 清流公園 橋上広場

NONOTAK

IMAGE NONOTAK Studio（ノノタック）
作家


パリを拠点に活動するアートユニット。イラストレーターのノエミ・シュパーと、建築家でミュージシャンのタカミ・ナカモトによる。光と音で没入型の空間をつくるインスタレーションを世界各地で発表

IMAGE
NONOTAK 作品画像

春吉橋側の南の起点。光は内向きに設計し、ライトアップと河川面に干渉させない


※設置・維持管理は公園管理者と協議。作家プロフィールは最終確認のうえ記載

1週間で終わらせない。「残るもの」と「続く仕組み」をイベントで仕込む

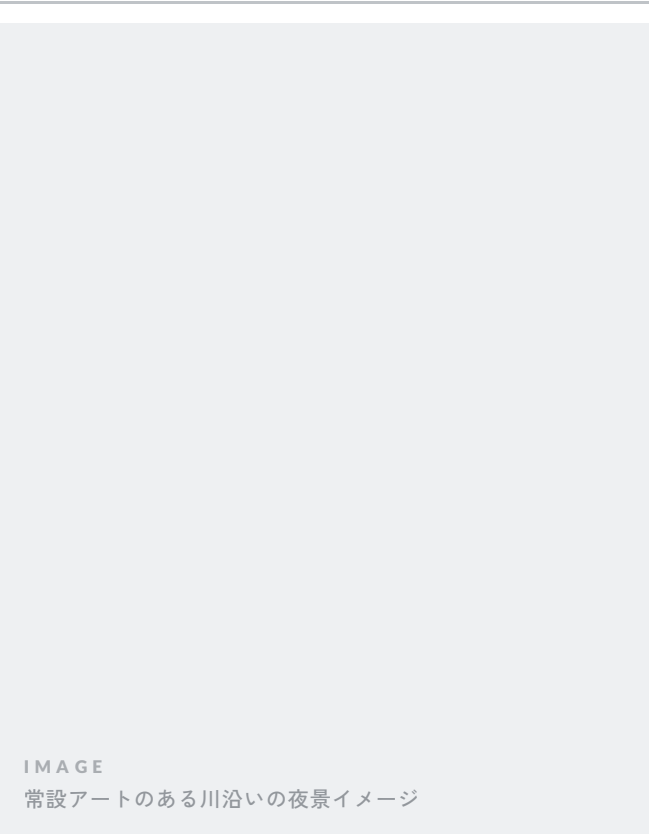


残る 常設アート2基

会期後も定番フォトスポットとして来訪の理由に

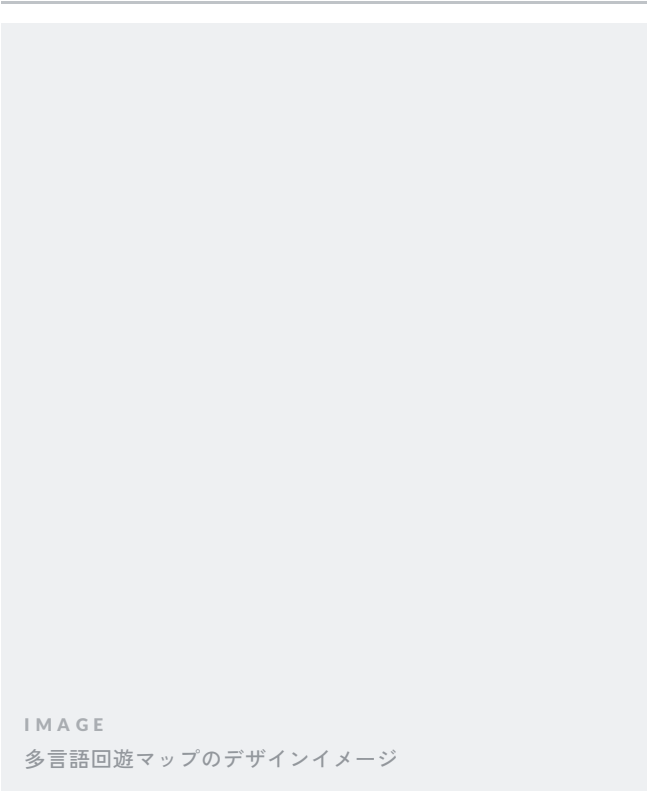

歩ける 夜の回遊マップ

ホテル・観光案内所・空港で配布し、いつでも使えるガイドに

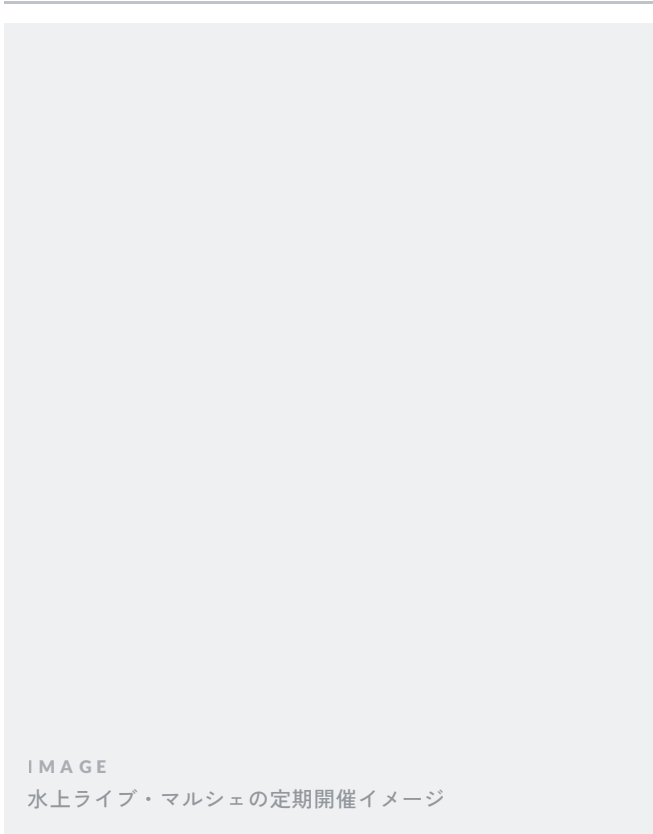

続く 定期プログラム化

反響の大きい企画を民間主体で定期開催

夜のモデルコース（例）

90分 天神 → DOBくん → であい橋 → 屋台

2時間 屋形船 → プロムナード → NONOTAK

はしご マルシェ → 春吉 → 中洲 → 屋台

展開ロードマップ（案）

2027.3	2027年度	2028～
本イベント アート設置	定期開催を 試行	須崎公園まで 延伸・民間運営へ

「発表」を4回つくり、会期までニュースを途切れさせない

12月	1月	2月	3月上旬	会期中・後
12/下 公式SNS開設 ライトアップ工事・アート制作のティザー発信	1/中 公式サイト公開（5言語） 発表① 開催決定・第1弾出演者	発表② メインアクト・整理券応募開始 2/下 発表③ 点灯式×アート除幕（記者発表会）	市政だより掲載・ポスター／サイネージ掲出 海外向け広告を強化、インフルエンサー来福	毎日の見どころ・混雑情報、ライブ配信 発表④ 実績リリース・アフタームービー

施策	内容	KPI（仮）	費用（円）
公式サイト	日・英・韓・繁中・簡中。タイムテーブル、整理券応募、回遊マップ	20万PV	800,000
SNS運用	Instagram・TikTok・Xを12～3月に運用。ハッシュタグのフォトコンテスト	フォロワー1万／投稿1万件	600,000
SNS広告	福岡都市圏と、韓国・台湾・香港の訪日予定者に配信	リーチ500万	700,000
インフルエンサー	国内5名・海外6名（韓・台・香）を招待し、会期中に取材・発信	投稿60本	600,000
メディアPR	リリース4回、点灯式×アート除幕の記者発表会	掲載50件	250,000
印刷・掲出	ポスター・フライヤー（多言語）、市の掲示板、交通機関のサイネージ、ホテル・観光案内所	配布3万部	250,000
合計（見積書「広報・プロモーション費」）			3,200,000

IMAGE
キービジュアル・ポスターのデザイン案

市の媒体（市政だより・市HP・掲示板）も活用し、来場者の投稿が次の来場者を呼ぶ循環をつくる

運営責任者のもとで全会場に人を配置し、安全を最優先に動かす

実施体制


福岡市

⇔

代表事業者（統括）
運営責任者：○○○○

企画・制作 [構成員名]	ステージ制作 [構成員名]
キャスティング [構成員名]	水上運営 [舟運事業者]
アート [構成員名]	回遊・デジタル [構成員名]
広報・PR [構成員名]	警備・安全 [警備会社]

人員配置図（会期中・イメージ）

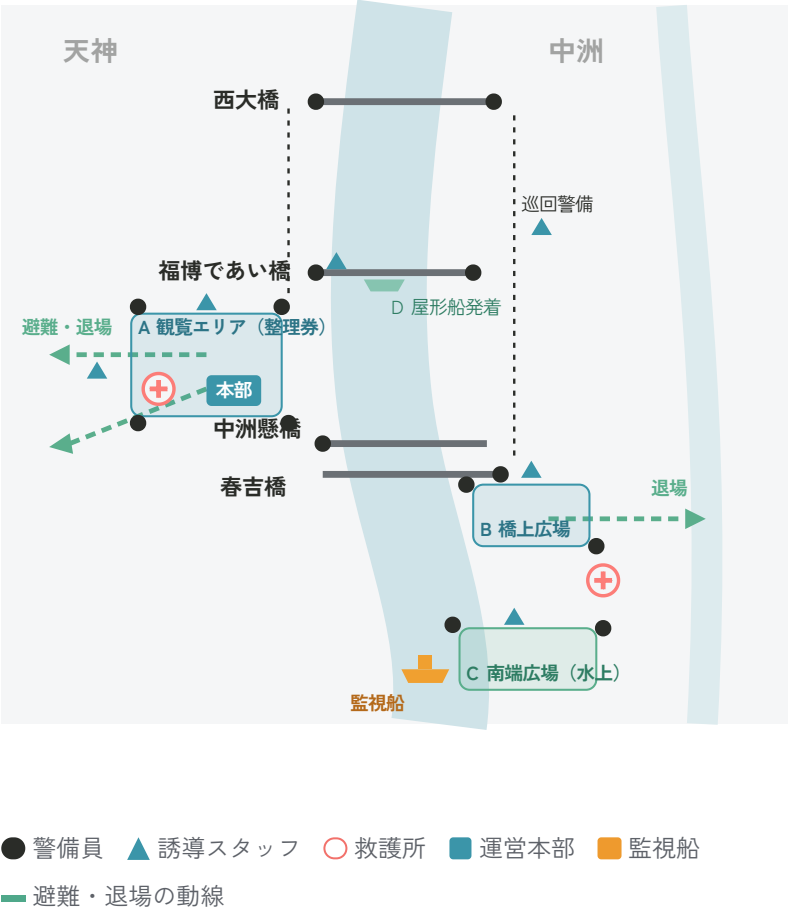

配置人数（1日あたり・仮）

配置場所	平日	土日	メイン アクト日
運営本部・救護	6	6	8
A 貴賓館前	14	16	40
B 橋上広場	8	10	10
C 南端広場・水上	-	10	10
D 屋形船発着	4	4	4
マルシェ・橋の巡回	10	12	16
合計	42	58	88

安全対策・緊急時対応

- － メインアクトは整理券制、観覧エリアを区切る
- － 水上：救命胴衣・監視船
- － 本部に救護所、医療機関と連携
- － 災害・テロ時の避難誘導、雨・強風時の中止基準

- － 責任者は完了まで交代なし
- － 市と週1回の定例会

関係者調整・許認可 地域・屋台組合、警察・消防、保健所、公園・河川管理者と契約直後から協議し、**占用許可・道路使用・食品営業**を進める。
詳細な警備計画は実施計画書で示す

許認可と出演者の確定を12月中に前倒しし、無理のない工程で3月を迎える

	11月		12月		1月		2月		3月	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
契約・実施計画書			実施計画書の作成							
関係者協議・許認可			公園・河川・警察・保健所との協議と申請							
出演者交渉・確定			出演交渉→確定							
アート制作・設置			設計・制作							設置
会場設計・設営			会場設計・資機材手配							設営
回遊ツール開発			スタンプラリー開発・テスト							
広報・プロモーション					サイト公開 → 出演者発表 → 会期中の発信					
イベント開催									開催	
撤去・効果検証・報告										報告

11/25～ 契約締結
すぐに関係者協議を開始

12月下旬 実施計画書の提出
出演者・会場計画を確定

3/13～3/21（案） 開催
土日2回を含む9日間、夕方～夜

3/31 実施報告書の提出
効果検証・今後の展開

委託費の範囲を超える価値を生む、4つの独自の取組み

01

協賛で事業を広げる

ステージ命名権やマルシェ協賛を集め、**委託費に上乗せ**して内容を充実させる

IMAGE

協賛ブース・命名権の事例

02

「ナイトパス」で店舗連携

周辺の飲食店・屋台で使える特典で、**イベントの外まで消費を広げる**

IMAGE

クーポン画面・参加店舗ステッカー

03

データで効果検証

人流データ・回遊ログ・アンケートで、**滞在時間と消費の変化**を示す

IMAGE

人流ヒートマップの分析イメージ

04

誰もが楽しめる運営

多言語案内、車いす動線、**ごみを減らす**マルシェ運営

IMAGE

多言語サイン・リユース食器の例

見積書（概算）

項目	内訳	金額（円・税抜）
企画・制作管理費	全体企画、実施計画書の作成、制作進行管理、関係者調整、許認可申請	2,800,000
会場設営・装飾費	ステージ2か所（A・B）、音響・照明・映像、電源・通信、テント・備品、装飾デザイン	8,100,000
出演・コンテンツ制作費	メインアクト、アイドル・サーカス・DJ等の出演料、演出制作	9,000,000
水上ステージ費	台船の手配・曳航・係留、ステージ設営、水上の安全管理（土日）	4,200,000
屋形船ジャズ費	屋形船チャーター、ジャズ出演料、予約システム	1,600,000
アート制作・設置費	常設アート2基の制作・輸送・設置・基礎工事、キュレーション	5,500,000
回遊施策費	デジタルスタンプラリーの開発・運用（5言語）、回遊マップ、特典・ノベルティ	1,400,000
マルシェ運営費	出店者の募集・調整、什器、リユース食器、衛生管理	1,000,000
広報・プロモーション費	公式サイト（5言語）、SNS運用・広告、インフルエンサー招待、PR、ポスター・フライヤー	3,200,000
警備・安全対策費	警備員の配置、救護所、整理券の運用、保険	3,300,000
運営スタッフ・清掃費	運営スタッフ、通訳、清掃・廃棄物処理	1,800,000
効果検証・報告書作成費	人流データ分析、アンケート、実施報告書の作成	600,000
小計		42,500,000
消費税及び地方消費税（10%）		4,250,000
合計（提案限度額 46,750,000円 以内）		46,750,000

※協賛金を得た場合は、上記に上乗せして事業内容の充実にあてる。出演料・アート費は交渉により変わる可能性あり
